

**COMUNE DI
SANT'ANGELO IN VADO**



Lavori di messa in sicurezza per rifacimento della copertura su edificio
Scuola Secondaria di primo grado sita nel capoluogo in via Roma n.47

H.1
Cronoprogramma

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Angelo in Vado
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SU EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA NEL CAPOLUOGO IN VIA ROMA N.47

COMMITTENTE: Comune di Sant'Angelo in Vado.

CANTIERE: via Roma n.47, Sant'Angelo in Vado (PU)

Mercatino Conca, 31/01/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lavanna Omar)

per presa visione

IL COMMITTENTE


(Arch. Giovannini Jenny)

Ingegnere Lavanna Omar

via Roma n.38/a
61013 Mercatino Conca (PU)
Tel.: tel. 3478721354 - Fax: -
E-Mail: stilo02@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3					Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	
Allestimento cantiere	3 g	▶▶																					
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																					
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di l	1 g	Z1																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g	Z1																					
Sostituzione copertura	142 g	▶																					
Rimozione di manto di copertura in tegole	9 g	Z1																					
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	9 g		Z1																				
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	14 g			Z1																			
Taglio di muratura a tutto spessore	15 g					Z1																	
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	15 g					Z1																	
Realizzazione di cordolo i.c.a. con carpenteria per le strutture	11 g									Z1													
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosa	8 g										Z1									Z1			
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	12 g											Z1											
Montaggio di arcarecci in legno	7 g												Z1										
Montaggio di tavolame in legno	9 g													Z1									
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	13 g																			Z1			
Impermeabilizzazione di coperture	7 g																					Z1	
Posa di manto di copertura in tegole	14 g																						
Realizzazione di opere di lattoneria	12 g																						
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso in	5 g																						
Rifacimento di cornicioni	8 g																						
Lavori in prospetto	24 g																						
Stuccatura di cadute di strati di intonaci	12 g																						
Tinteggiatura di superfici esterne	12 g																						
Lavori interni	53 g																						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	9 g																						
Tinteggiatura di superfici interne	16 g																						
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	7 g																						
LEGENDA Zona:																							
Z1 = esterno cortile																							

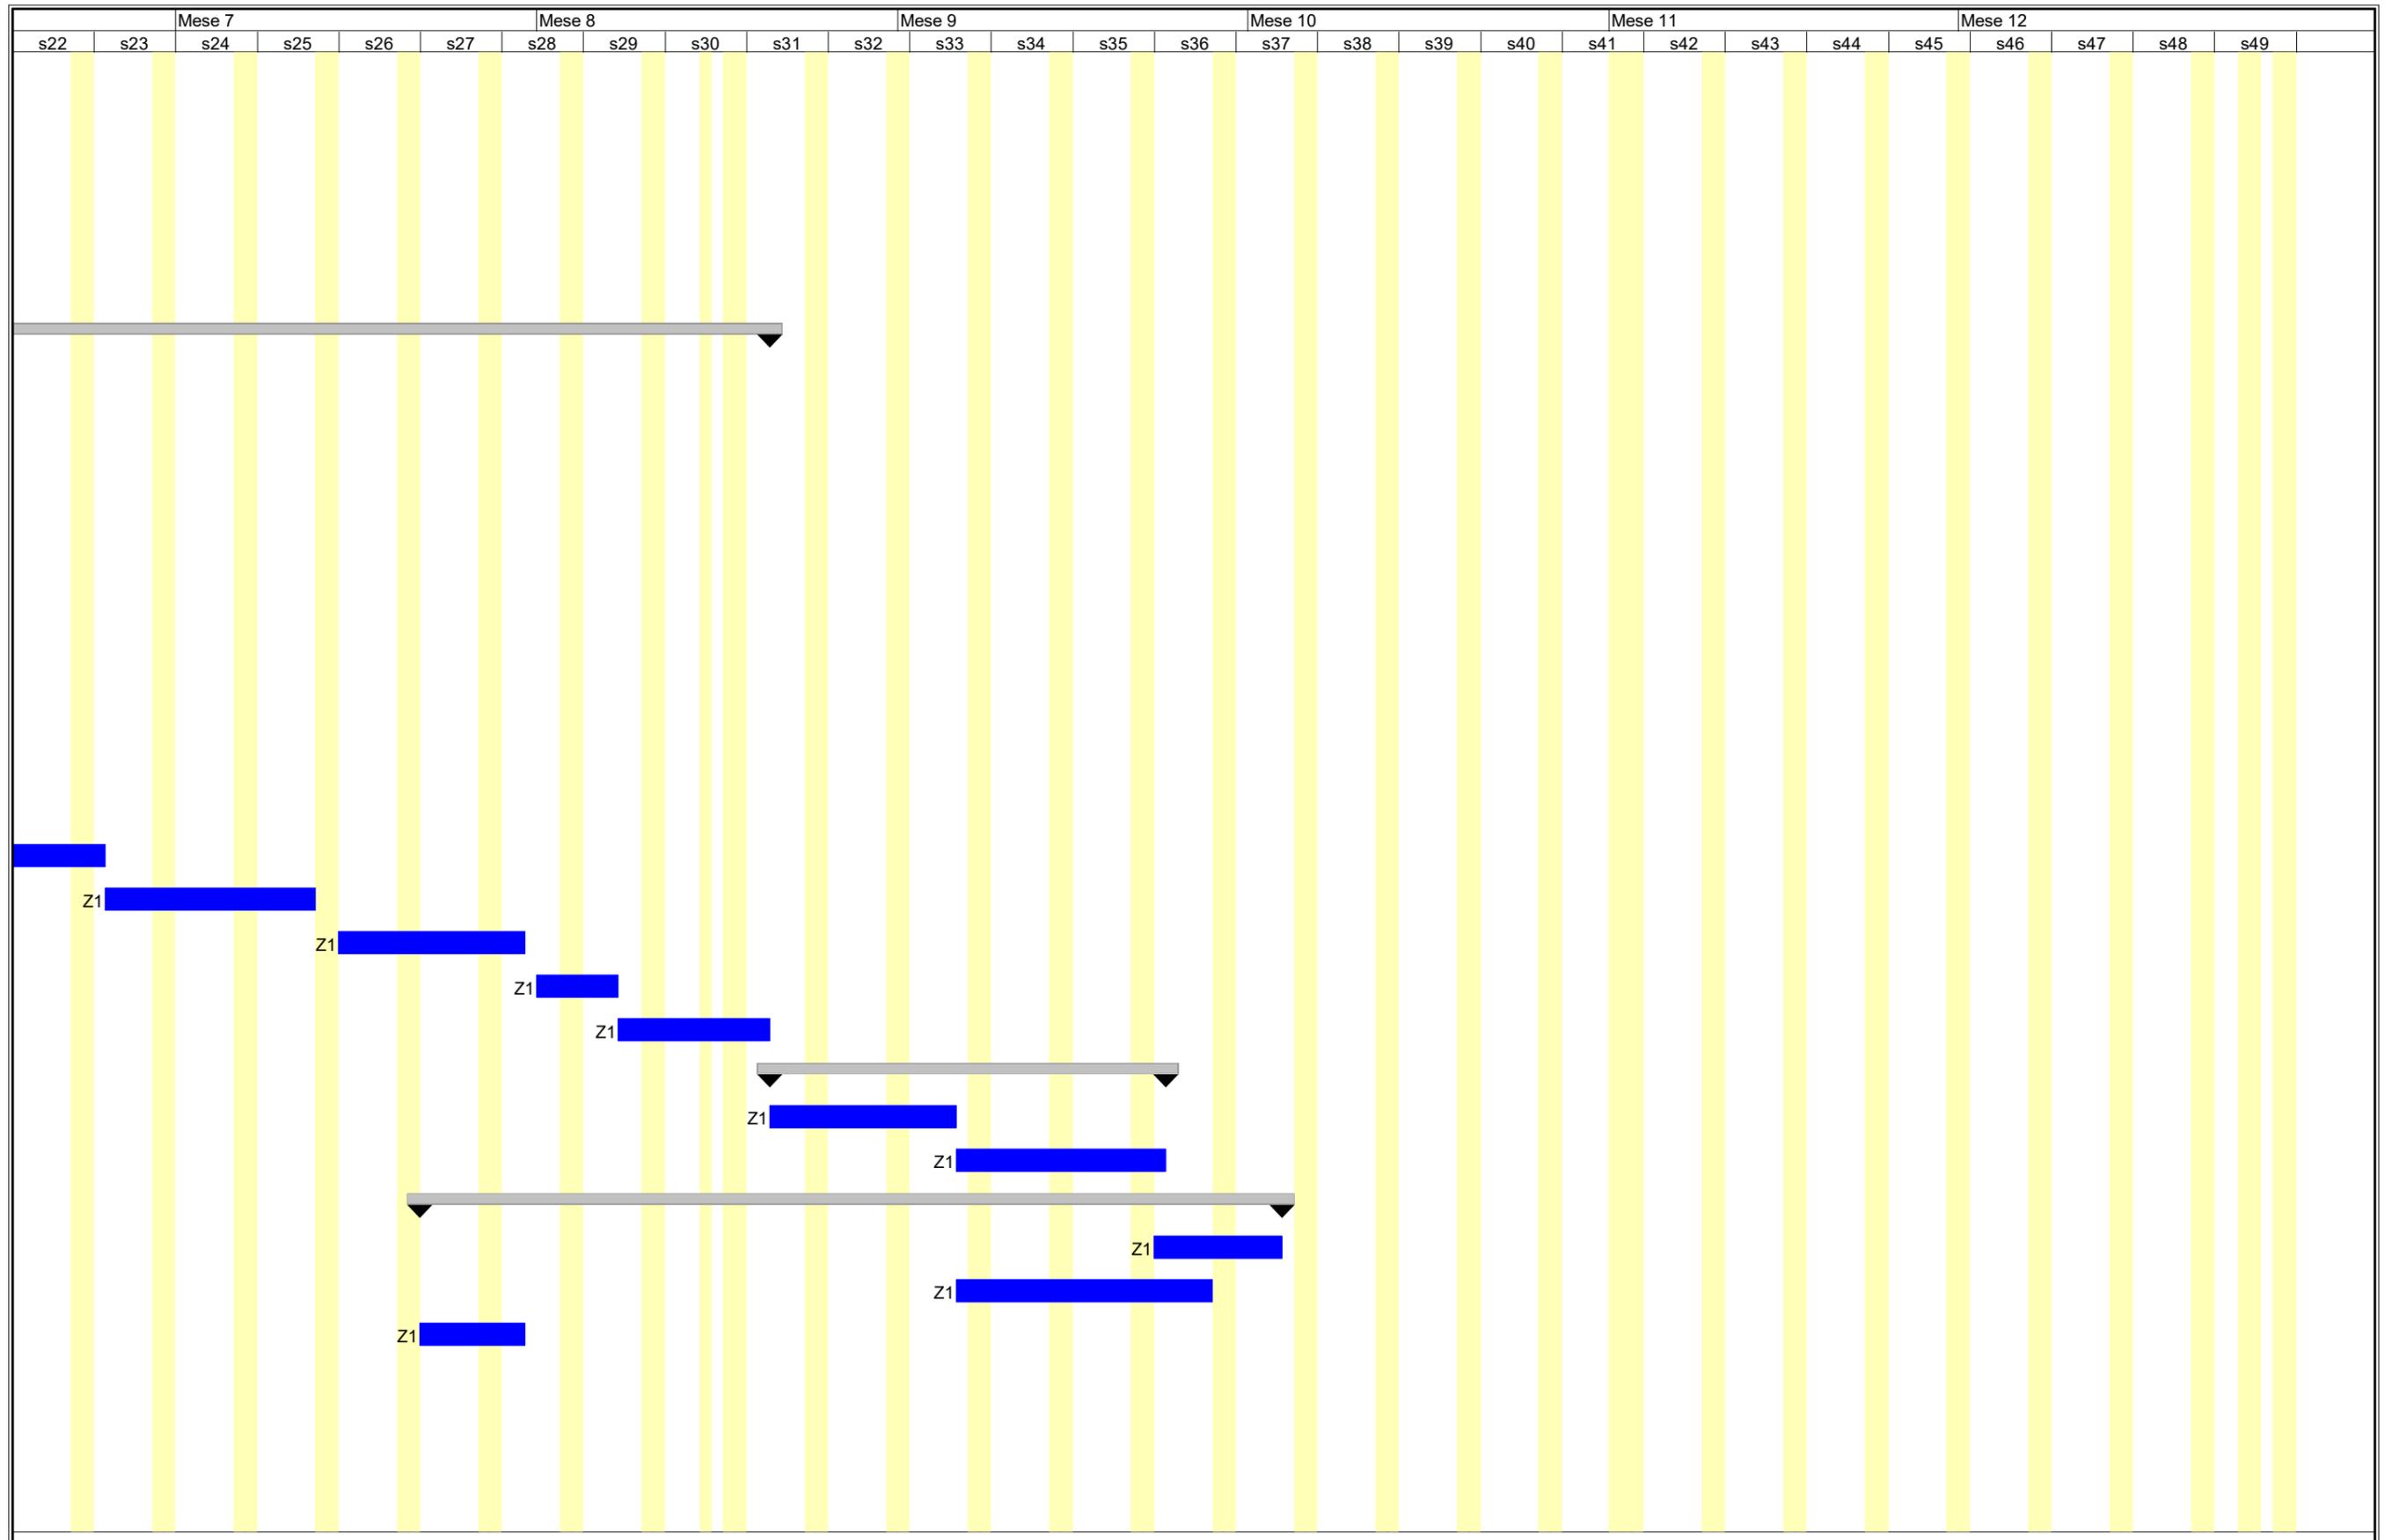

		Mese 7					Mese 8					Mese 9					Mese 10					Mese 11					Mese 12				
s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49				
